

Programa Completo — Quinta do Visconde de Salreu

Versão: 1.0

Data: 05 de março de 2026

Localização: Freguesia de Salreu, Concelho de Estarreja, Distrito de Aveiro

Investimento Total: €2.070.000

Duração: 30 meses

1. Enquadramento

O presente documento constitui o **Programa Completo** do projeto de restauro e requalificação da Quinta do Visconde de Salreu, detalhando todas as componentes de intervenção física, programas de formação, modelo turístico, programação cultural, modelo operacional e plano de ação. Este programa serve como guia de execução para todas as fases do projeto, desde a conceção até à operação plena.

A Quinta do Visconde de Salreu é um solar histórico do século XIX situado na freguesia de Salreu, concelho de Estarreja, distrito de Aveiro. A propriedade inclui um palacete senhorial (~600 m²), anexos agrícolas (lagar de azeite, lagar de vinho, casa de lenha, garagem, estufas), um jardim histórico com espécies botânicas raras de todo o mundo e um sistema de irrigação por gravidade que constitui uma obra de engenharia hidráulica notável. O Visconde de Salreu foi o maior exportador de azeite da região, e a Quinta funcionava como uma fazenda produtiva completa com leiteiras, produção de vinho, lagar de azeite, lagar de vinho e uma antiga queijaria.

2. Programa de Intervenção Física

2.1. Solar Principal — Restauro Integral (€900.000)

O solar principal será restaurado integralmente, respeitando o valor patrimonial do edifício e adaptando-o para as novas funções de centro cultural, espaço expositivo e área administrativa.

2.1.1. Intervenção Estrutural (Meses 7-14)

Trabalho	Descrição Técnica	Investimento
Fundações	Consolidação com injeção de caldas	€80.000

	de cal hidráulica; reforço de sapatas existentes	
Paredes resistentes	Tratamento de fissuras com grampos em aço inox; refecimento de juntas com argamassa de cal	€70.000
Pavimentos estruturais	Substituição de vigas de madeira deterioradas; tratamento antifúngico e anti-xilófago	€50.000
Cobertura	Substituição integral: estrutura em madeira de castanho, telha canudo tradicional, subtelha, isolamento térmico	€100.000

2.1.2. Restauro de Interiores (Meses 12-20)

Trabalho	Descrição Técnica	Investimento
Estuques decorativos	Limpeza, consolidação e reintegração cromática de estuques ornamentais nos tetos e cornijas	€60.000
Pinturas murais	Levantamento, fixação de policromias, reintegração de lacunas com técnica de tratteggio	€40.000
Pavimentos em madeira	Restauro de soalhos em pinho e castanho; substituição pontual de tábuas; enceramento	€30.000
Azulejaria interior	Limpeza, consolidação, refixação de peças soltas, reintegração de lacunas	€40.000
Carpintarias interiores	Restauro de portas, rodapés, lambris, escadaria principal — madeiras nobres	€40.000
Elementos pétreos	Restauro de lareiras, soleiras, peitoris, brasões em pedra de Ançã	€20.000
Ferragens e gradeamentos	Restauro de fechaduras, puxadores, dobradiças, gradeamentos em ferro forjado	€20.000

2.1.3. Instalações Técnicas (Meses 14-20)

Sistema	Descrição Técnica	Investimento
Rede elétrica	Quadro geral, circuitos de iluminação e tomadas, UPS, proteção diferencial (35 €/m ²)	€60.000
Rede hidráulica	Abastecimento de água, drenagem de águas residuais, rede de incêndio (25 €/m ²)	€50.000
AVAC	Sistema de climatização por condutas ocultas, compatível com o edifício histórico	€50.000
Segurança contra incêndio	Deteção automática, extintores, sinalética, plano de emergência	€20.000
Telecomunicações	Rede estruturada de dados, Wi-Fi, sistema de som ambiente	€20.000

2.1.4. Caixilharias e Fachadas (Meses 16-22)

Trabalho	Descrição Técnica	Investimento
Caixilharias em madeira	Restauro e substituição de janelas de guilhotina e batente (180 €/m ² de vão)	€60.000
Vidros	Vidro duplo com perfil compatível com caixilharia histórica	€15.000
Fachadas	Limpeza de cantarias, refechamento de juntas, pintura a cal	€20.000
Varandas e guardas	Restauro de guardas em ferro forjado, impermeabilização de varandas	€5.000

2.1.5. Distribuição Funcional do Solar

Piso	Área (m ²)	Função	Descrição
Rés-do-chão	200	Espaço expositivo e receção	Sala de exposições permanente (história da Quinta), receção de visitantes, loja de



			artesanato
Rés-do-chão	100	Cozinha pedagógica	Cozinha equipada para workshops de culinária tradicional (pão, azeite, arroz, vinho)
1.º Andar	150	Salas de formação e eventos	2 salas polivalentes para formação teórica, workshops e eventos culturais
1.º Andar	100	Área administrativa	Gabinetes de gestão, sala de reuniões, arquivo
Sótão	50	Armazém e apoio técnico	Armazenamento de materiais, equipamentos e apoio logístico

2.2. Jardim Histórico e Sistema Hidráulico (€350.000)

O jardim é o elemento central e diferenciador do projeto. O restauro será orientado pelo pré-projeto de **Cristina Castelo Branco** e pela documentação botânica do naturalista **Brotero** (1744-1828).

2.2.1. Sistema de Captação de Água por Gravidade (Meses 7-18)

O sistema hidráulico da Quinta é uma obra de engenharia do século XIX que capta água de nascentes a cotas superiores e distribui por gravidade através de uma rede de dutos, canalizações e reservatórios. O restauro deste sistema é prioritário por ser simultaneamente funcional (rega do jardim) e patrimonial (valor histórico e técnico).

Trabalho	Descrição Técnica	Investimento
Levantamento topográfico e hidráulico	Mapeamento completo da rede de captação, condução e distribuição	€15.000
Restauro de nascentes e captações	Limpeza, impermeabilização, proteção das nascentes	€25.000
Restauro de dutos e canalizações	Substituição de troços degradados, manutenção de troços originais em pedra	€50.000
Reservatórios e tanques	Restauro de reservatórios de acumulação, impermeabilização	€30.000
Rede de distribuição	Restauro da rede de rega por gravidade, válvulas, registos	€20.000



Sinalética interpretativa	Painéis explicativos do sistema hidráulico para visitantes	€10.000
---------------------------	--	---------

2.2.2. Estruturas Paisagísticas (Meses 10-22)

Trabalho	Descrição Técnica	Investimento
Muros e vedações	Restauro de muros em pedra seca e argamassa de cal; reposição de troços em ruína	€30.000
Caminhos e percursos	Restauro de caminhos em saibro e pedra; drenagem superficial	€25.000
Lago e ponte	Limpeza, impermeabilização do lago; restauro da ponte ornamental	€20.000
Canteiros e parterres	Reconstrução de canteiros formais conforme desenho original	€15.000
Jardim de Monteijo	Restauro integral desta secção específica do jardim	€10.000

2.2.3. Replantação e Paisagismo (Meses 14-24)

Trabalho	Descrição Técnica	Investimento
Inventário botânico	Levantamento e identificação de todas as espécies existentes	€5.000
Aquisição de espécies	Espécies raras e tradicionais conforme plano de Cristina Castelo Branco	€25.000
Plantação e transplante	Trabalhos de plantação, tutoragem, rega inicial	€15.000
Estufas	Restauro das duas estufas históricas para propagação de espécies	€15.000

2.2.4. Iluminação e Mobiliário de Jardim (Meses 20-24)

Trabalho	Descrição Técnica	Investimento
Iluminação cénica	Projetores LED de baixo consumo, iluminação de caminhos e pontos	€20.000

	focais	
Mobiliário de jardim	Bancos em ferro fundido e madeira, mesas, papeleiras	€10.000
Sinalética interpretativa	Placas de identificação de espécies, painéis temáticos, QR codes	€10.000

2.3. Unidades de Alojamento Turístico — 14 unidades (€400.000)

Os anexos agrícolas da Quinta serão convertidos em unidades de alojamento local no modelo Airbnb, mantendo a autenticidade arquitetónica e oferecendo conforto contemporâneo.

2.3.1. Programa de Conversão

Edifício Original	Unidades	Tipologia	Área/un. (m²)	Capacidade	Investimento
Garagem	3	T0 Studio	35	2 pessoas	€105.000
Lagar de vinho	3	T1	35	2-3 pessoas	€105.000
Casa de lenha	2	T0 Studio	25	2 pessoas	€50.000
Anexo lateral	4	T1	25	2-3 pessoas	€100.000
Outros espaços	2	T0 Suite	20	2 pessoas	€40.000
Subtotal construção	14		400	28-36	€350.000

2.3.2. Especificações por Unidade

Cada unidade de alojamento incluirá:

Elemento	Especificação
Estrutura	Paredes em alvenaria de pedra (existentes), cobertura em madeira e telha
Pavimento	Soalho em madeira de pinho ou tijoleira artesanal
Cozinha	Kitchenette equipada (placa, frigorífico, micro-ondas, louça)
Casa de banho	Duche, lavatório, sanita — acabamentos em pedra natural e azulejo artesanal
Climatização	Ar condicionado split ou salamandra a lenha (conforme tipologia)

Mobiliário	Cama, mesa, cadeiras, armário — design contemporâneo com materiais tradicionais
Tecnologia	Wi-Fi, TV, fechadura eletrónica, iluminação LED
Exterior	Terraço ou pátio privativo com vista para o jardim

2.3.3. Mobiliário e Equipamento (€50.000)

Item	Quantidade	Custo Unitário	Total
Camas e colchões	14	€800	€11.200
Mobiliário de quarto	14	€600	€8.400
Kitchenette equipada	14	€500	€7.000
Equipamento de casa de banho	14	€400	€5.600
Roupa de cama e banho	14	€300	€4.200
Decoração e arte local	14	€200	€2.800
Tecnologia (TV, Wi-Fi, fechadura)	14	€500	€7.000
Reserva e extras	—	—	€3.800
Total			€50.000

2.4. Centro de Formação (€160.000)

O centro de formação será adaptado a partir de espaços existentes na Quinta, com 200 m² de área útil distribuídos por três zonas funcionais.

2.4.1. Distribuição Funcional

Zona	Área (m ²)	Função	Equipamento
Sala teórica	50	Aulas teóricas, palestras, projeções	20 lugares, projetor, quadro interativo, sistema de som
Oficina de culinária	80	Workshops práticos de culinária tradicional	2 bancadas de trabalho, forno a lenha, fogão industrial, utensílios
Oficina de artes têxteis	70	Bordados, rendados,	10 postos de trabalho, teares, bastidores,

		tecelagem	iluminação direcional
--	--	-----------	-----------------------

2.4.2. Obras de Adaptação (€160.000)

Trabalho	Descrição	Investimento
Estrutura e cobertura	Reforço estrutural, substituição de cobertura	€40.000
Pavimentos e paredes	Pavimento em mosaico hidráulico, paredes rebocadas e pintadas	€25.000
Instalações técnicas	Rede elétrica reforçada, água, gás, exaustão	€35.000
Caixilharias e vãos	Janelas em alumínio com rotura térmica, portas	€20.000
Acessibilidade	Rampa de acesso, casa de banho adaptada	€15.000
Acabamentos e decoração	Pintura, revestimentos, sinalética	€15.000
Espaço exterior	Pátio coberto para atividades ao ar livre	€10.000

3. Programa de Formação

3.1. Visão Geral

O programa de formação da Quinta do Visconde articula cinco áreas temáticas, cada uma com cursos de longa duração (certificados pelo IEFP/DGERT) e workshops de curta duração (abertos ao público e turistas). A formação é simultaneamente um instrumento de inclusão social e uma fonte de receita.

3.2. Área 1 — Culinária Tradicional

A culinária da região de Aveiro é marcada pelo azeite, pelo arroz das Rias, pelo pão de milho, pelo vinho e pela queijaria. A Quinta do Visconde, enquanto antiga fazenda produtiva com lagar de azeite e lagar de vinho, é o cenário ideal para a transmissão destes saberes.

Cursos de Longa Duração (Certificados IEFP/DGERT)

Curso	Duração	Formandos	Conteúdo Programático
Mestre Padeiro	200 horas (3 meses)	12	Fermentação natural, massa-mãe, pão de milho,



Tradicional			broa, pão de centeio; forno a lenha; técnicas ancestrais de panificação
Mestre Oleicultor e Azeite	150 horas (2,5 meses)	10	Cultivo do olival, colheita, moagem tradicional e moderna, prova de azeite, conservação, rotulagem, legislação DOP
Arrozeiro das Rias de Aveiro	120 horas (2 meses)	10	Cultivo do arroz em águas salobras, variedades tradicionais, técnicas de sementeira e colheita, gastronomia do arroz
Vinicultor e Enólogo Artesanal	150 horas (2,5 meses)	10	Viticultura, vindima, vinificação artesanal no lagar, prova, conservação, rotulagem

Workshops de Curta Duração (Abertos ao Público)

Workshop	Duração	Participantes	Preço	Frequência
Pão no Forno a Lenha	3 horas	8-12	€35/pessoa	2×/semana
Prova de Azeite e Harmonização	2 horas	10-15	€25/pessoa	1×/semana
Cozinha Tradicional Aveirense	4 horas	8-10	€45/pessoa	2×/semana
Vindima e Pisa de Uvas (sazonal)	6 horas	15-20	€50/pessoa	Set-Out
Queijaria Artesanal	3 horas	8-10	€30/pessoa	1×/semana

3.3. Área 2 — Jardinismo e Botânica

O jardim histórico da Quinta, com espécies raras de todo o mundo, é um laboratório vivo para a formação em jardinismo, paisagismo e botânica. A parceria com **Cristina Castelo Branco** (paisagista autora do pré-projeto) e a referência ao naturalista **Brotero** conferem credibilidade académica ao programa.

Cursos de Longa Duração

Curso	Duração	Formandos	Conteúdo Programático
Jardineiro de Jardins Históricos	250 horas (4 meses)	10	Identificação de espécies, poda, propagação, rega, fitossanidade, restauro de jardins históricos, sistema hídrico por gravidade
Viveirista e Propagação de Plantas	150 horas (2,5 meses)	8	Técnicas de propagação (semente, estaca, enxertia), gestão de estufa, substrato, comercialização

Workshops de Curta Duração

Workshop	Duração	Participantes	Preço	Frequência
Visita Guiada Botânica	2 horas	15-20	€15/pessoa	3×/semana
Poda e Manutenção de Jardim	3 horas	8-10	€25/pessoa	1×/semana
Propagação de Plantas Raras	3 horas	6-8	€30/pessoa	1×/quinzena
Composição Floral com Espécies do Jardim	2 horas	8-10	€20/pessoa	1×/semana
Sistema Hidráulico por Gravidade (visita técnica)	1,5 horas	10-15	€12/pessoa	2×/semana

3.4. Área 3 — Música e Artes Performativas

Em parceria com a **Banda Visconde de Salreu** (fundada em 1925), o programa de música integra a tradição filarmónica da região com novas formas de expressão artística. A Banda mantém uma escola de música ativa e manifestou interesse em realizar concertos nos jardins da Quinta.

Cursos de Longa Duração

Curso	Duração	Formandos	Conteúdo Programático
Instrumentista de	300 horas (5 meses)	15	Instrumento (sopro,



Filarmónica			percussão), leitura musical, ensemble, repertório filarmónico, história da música portuguesa
Produção de Eventos Culturais	120 horas (2 meses)	10	Gestão de eventos, produção técnica, som e luz, comunicação, logística

Programação Cultural Regular

Evento	Frequência	Capacidade	Preço	Receita Estimada/Ano
Concertos nos Jardins (Banda)	2x/mês (Abr-Out)	100-200	€10-€15	€21.000
Noites de Fado no Solar	1x/mês	40-60	€20	€9.600
Festival de Verão (anual)	1x/ano (Jul)	500-1.000	€25	€12.500
Recitais de Câmara	1x/mês	30-50	€15	€5.400

3.5. Área 4 — Bordados, Rendados e Artes Têxteis

Em parceria com a **Escola de Laceiras**, o programa preserva e transmite as técnicas tradicionais de bordado e renda da região de Aveiro, que remontam ao século XVI e são reconhecidas como património cultural imaterial.

Cursos de Longa Duração

Curso	Duração	Formandos	Conteúdo Programático
Rendeira / Laceira Tradicional	300 horas (5 meses)	8	Renda de bilros, renda de agulha, padrões tradicionais, criação de peças originais, história da renda portuguesa
Bordadeira Tradicional	200 horas (3 meses)	10	Bordado de Castelo Branco, bordado de Viana, ponto cruz, richelieu, aplicação em

			peças contemporâneas
--	--	--	----------------------

Workshops de Curta Duração

Workshop	Duração	Participantes	Preço	Frequência
Iniciação à Renda de Bilros	3 horas	6-8	€30/pessoa	1×/semana
Bordado Tradicional Português	3 horas	8-10	€25/pessoa	1×/semana
Tecelagem em Tear Manual	4 horas	6	€35/pessoa	1×/quinzena
Tingimento Natural de Fibras	3 horas	8-10	€25/pessoa	1×/mês

3.6. Área 5 — Decoração e Artes Aplicadas

O solar do Visconde, com os seus interiores ricamente decorados (estuques, pinturas murais, azulejaria), é o cenário ideal para a formação em artes decorativas e restauro.

Cursos de Longa Duração

Curso	Duração	Formandos	Conteúdo Programático
Restauro de Mobiliário Antigo	200 horas (3 meses)	8	Identificação de estilos, técnicas de limpeza, consolidação, acabamento, douramento, estofamento
Pintura Decorativa e Estuque	150 horas (2,5 meses)	8	Técnicas de pintura mural, fingidos, marmoreados, estuque ornamental, reintegração cromática

Workshops de Curta Duração

Workshop	Duração	Participantes	Preço	Frequência
Restauro de Móveis (Introdução)	4 horas	6-8	€40/pessoa	1×/quinzena

Pintura Decorativa em Azulejo	3 horas	8-10	€30/pessoa	1×/semana
Douramento e Patine	3 horas	6-8	€35/pessoa	1×/mês

3.7. Resumo do Programa de Formação

Indicador	Cursos Longos	Workshops	Total
N.º de programas	10	16	26
Formandos/ano (estimativa)	50-80	1.500-2.500	1.550-2.580
Horas de formação/ano	4.000-6.000	3.000-5.000	7.000-11.000
Receita estimada/ano	€100.000	€80.000-€120.000	€180.000-€220.000

4. Programa Turístico

4.1. Modelo de Alojamento

O modelo turístico da Quinta assenta no conceito de **turismo de experiência imersiva**, onde o hóspede não é apenas um visitante passivo, mas participa ativamente nas atividades da Quinta.

Tarifário de Alojamento

Tipologia	Época Baixa (Nov-Mar)	Época Média (Abr-Jun, Out)	Época Alta (Jul-Set)
T0 Studio (2 pax)	€55/noite	€75/noite	€95/noite
T1 (2-3 pax)	€70/noite	€90/noite	€120/noite
T0 Suite (2 pax)	€60/noite	€80/noite	€100/noite

Pacotes de Experiência

Pacote	Duração	Inclui	Preço
Fim de Semana na Quinta	2 noites	Alojamento T1 + 1 workshop culinária + visita botânica + pequeno-almoço	€250/casal



Semana de Artes e Ofícios	5 noites	Alojamento T1 + 3 workshops (culinária + bordado + jardinismo) + visitas + refeições	€600/pessoa
Retiro Musical	3 noites	Alojamento + 2 sessões de música + concerto nos jardins + refeições	€350/pessoa
Experiência Botânica	2 noites	Alojamento + visita guiada ao jardim + workshop propagação + visita ao sistema hídrico	€200/pessoa

4.2. Programa de Visitas

Visita	Duração	Preço	Capacidade	Frequência
Visita completa à Quinta (solar + jardim + anexos)	2 horas	€12/pessoa	20	Diária
Visita ao Jardim Histórico	1,5 horas	€8/pessoa	15	2×/dia
Visita ao Sistema Hidráulico	1 hora	€6/pessoa	10	1×/dia
Visita ao Lagar de Azeite	45 min	€5/pessoa	12	1×/dia
Visita escolar (programa educativo)	3 horas	€6/aluno	30	Sob marcação

4.3. Loja de Artesanato e Produtos Locais

A loja, instalada no rés-do-chão do solar, comercializará produtos produzidos na Quinta e por artesãos locais.

Categoria	Produtos	Margem Estimada
Azeite e vinagre	Azeite DOP, vinagre artesanal	40%
Vinho	Vinho da Quinta (produção limitada)	50%
Pão e doçaria	Broa de milho, doces regionais	35%



Bordados e rendas	Peças produzidas nas oficinas	30%
Cerâmica e artesanato	Peças de artesãos locais	25%
Plantas e sementes	Espécies do jardim, sementes raras	60%
Livros e publicações	Guias botânicos, história da Quinta	40%

5. Programa Cultural

5.1. Calendário Anual de Eventos

Mês	Evento Principal	Descrição	Público Esperado
Janeiro	Festa dos Reis e Janeiras	Concerto da Banda, cantar dos Reis	100-200
Fevereiro	Jornadas do Azeite Novo	Provas, workshops, gastronomia	200-300
Março	Primavera no Jardim	Abertura da temporada botânica, visitas guiadas especiais	300-500
Abril	Páscoa na Quinta	Atividades para famílias, caça aos ovos no jardim	200-400
Maio	Festival de Bordados e Rendas	Exposição, demonstrações, venda de peças	300-500
Junho	Noite de São João nos Jardins	Concerto da Banda, fogueira, sardinhada	500-800
Julho	Festival de Verão da Quinta	3 dias de música, gastronomia, artesanato	500-1.000
Agosto	Noites de Fado no Solar	Ciclo de 4 noites de fado	200-300
Setembro	Vindima e Pisa de Uvas	Vindima participativa, pisa no lagar, prova	200-400
Outubro	Jornadas de Outono	Colheita de frutos, conservas, compotas	150-300
Novembro	Magusto na Quinta	Castanhas, vinho novo, música tradicional	200-400
Dezembro	Natal na Quinta	Mercado de Natal, presépio vivo, concerto	300-500



5.2. Exposições Permanentes

Exposição	Localização	Conteúdo
História da Quinta do Visconde	Solar — Rés-do-chão	Documentos, fotografias, objetos do Visconde de Salreu; história do azeite na região
Flora do Jardim Histórico	Jardim — Percorso interpretativo	Placas de identificação de espécies, painéis sobre Brotero e Cristina Castelo Branco
Engenharia Hidráulica do Séc. XIX	Jardim — Sistema hídrico	Percorso interpretativo sobre o sistema de captação por gravidade
Os 11 Moinhos de Salreu	Solar — 1.º Andar	Documentação sobre os moinhos antigos de pão e trigo da região

6. Modelo Operacional

6.1. Estrutura de Recursos Humanos

Função	N.º	Tipo de Contrato	Salário Mensal (€)	Custo Anual (€)
Diretor/Gestor do Projeto	1	Tempo inteiro	2.000	28.000
Coordenador de Formação	1	Tempo inteiro	1.500	21.000
Rececionista / Gestão de Reservas	1	Tempo inteiro	1.000	14.000
Jardineiro-chefe	1	Tempo inteiro	1.200	16.800
Auxiliar de jardinagem	1	Tempo inteiro	820	11.480
Limpeza e manutenção	2	Tempo parcial	600	16.800
Formadores (por área)	5	Prestação de serviços	Variável	30.000
Total	12			€138.080

6.2. Custos Operacionais Anuais (Operação Plena)

Rubrica	Custo Anual (€)
Recursos humanos	138.080
Energia, água e telecomunicações	18.000
Manutenção de edifícios e jardim	25.000
Seguros	8.000
Marketing e comunicação	12.000
Materiais de formação e consumíveis	10.000
Contabilidade e serviços jurídicos	6.000
Impostos e taxas	5.000
Reserva operacional	10.000
Total Custos Operacionais	€232.080

6.3. Conta de Exploração Previsional (Ano 3)

Rubrica	Valor (€)
Receitas	
Alojamento turístico	196.000
Formação (cursos longos)	100.000
Workshops e experiências	100.000
Eventos culturais	48.500
Visitas guiadas	25.000
Loja de artesanato e produtos	20.000
Total Receitas	489.500
Custos	
Custos operacionais	232.080
Resultado Operacional	€257.420

7. Cronograma Detalhado (30 meses)

Fase 1 — Estudo e Projeto (Meses 1-6)

Mês	Atividade	Responsável
1	Levantamento arquitetónico e topográfico	Arquiteto
1-2	Estudo estrutural e geotécnico	Engenheiro
2-3	Projeto de arquitetura (anteprojecto)	Arquiteto
3-4	Projeto de especialidades (estruturas, AVAC, eletricidade, hidráulica)	Engenheiros
2-4	Projeto de jardinismo e paisagismo (Cristina Castelo Branco)	Paisagista
3-5	Licenciamento (Câmara de Estarreja, DGPC)	Arquiteto + IPNS
1-6	Candidaturas a financiamento (PRR, FSE+, EEA Grants)	IPNS
4-6	Concurso para empreiteiro	IPNS

Fase 2 — Estrutura e Cobertura (Meses 7-14)

Mês	Atividade	Responsável
7-8	Montagem de estaleiro, proteções, escoramentos	Empreiteiro
7-10	Consolidação de fundações e paredes	Empreiteiro
9-12	Substituição de coberturas (solar e anexos)	Empreiteiro
10-14	Tratamento de madeiras estruturais	Empreiteiro
8-14	Início do restauro do sistema hidráulico	Empreiteiro + Especialista
10-14	Início dos trabalhos de paisagismo (estruturas)	Paisagista



Fase 3 — Acabamentos e Conversões (Meses 15-24)

Mês	Atividade	Responsável
15-18	Instalações técnicas (eletricidade, água, AVAC)	Empreiteiro
15-20	Restauro de interiores do solar (estuques, pinturas, pavimentos)	Restauradores
16-20	Caixilharias e fachadas	Empreiteiro
17-22	Conversão de anexos em unidades de alojamento	Empreiteiro
18-22	Adaptação do centro de formação	Empreiteiro
18-24	Replantação e paisagismo do jardim	Paisagista
20-24	Conclusão do restauro do sistema hídrico	Especialista
22-24	Mobiliário e equipamento (alojamento + formação)	IPNS
22-24	Certificação DGERT	IPNS

Fase 4 — Operação (Meses 25-30)


Mês	Atividade	Responsável
25	Recrutamento e formação de equipa	Gestor
25-26	Testes e ajustes operacionais	Gestor
26	Registo no Turismo de Portugal (AL)	IPNS
26-27	Lançamento de plataformas digitais (website, Airbnb, Booking)	Marketing
27	Inauguração oficial	IPNS + Câmara
27-28	Abertura das primeiras unidades de alojamento	Gestor
28-29	Início dos programas de formação	Coordenador
29-30	Primeiros eventos culturais (concertos nos jardins)	Banda + Gestor
30	Avaliação do primeiro trimestre de operação	IPNS


8. Indicadores de Monitorização

Indicador	Meta (Ano 1)	Meta (Ano 2)	Meta (Ano 3)
Taxa de ocupação (alojamento)	30%	40%	45%+
N.º de formandos (cursos longos)	30	50	80
N.º de participantes (workshops)	500	1.200	2.500
N.º de visitantes (visitas guiadas)	2.000	4.000	7.000
N.º de eventos culturais	15	25	35+
Receita total	€200.000	€350.000	€489.500
Satisfação dos hóspedes (1-5)	4,2	4,5	4,7+
Postos de trabalho criados	8	10	12+

9. Anexos

Anexo A — Planta Funcional da Quinta

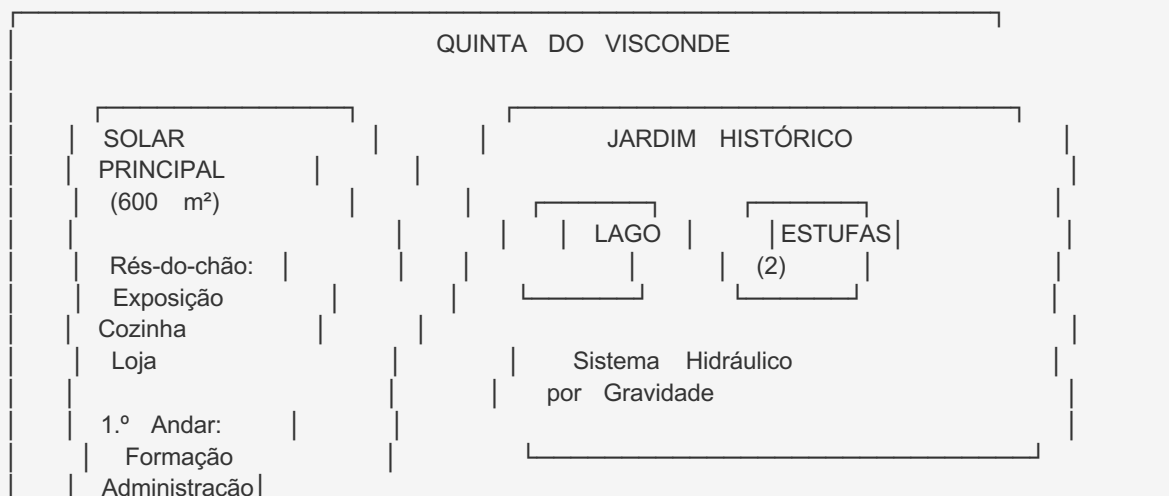

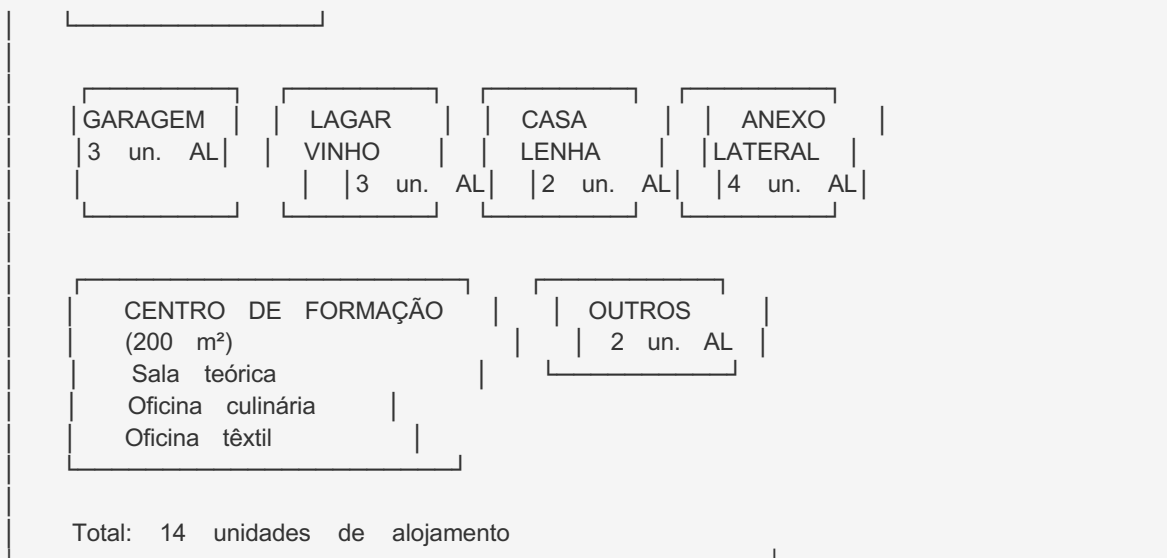

Anexo B — Contactos do Projeto

Entidade	Contacto	Papel
IPNS — Instituto Português de Negócios Sociais	Diego Rocha, dmrdiego@gmail.com, +351 931 721 901	Assessor estratégico
Banda Visconde de Salreu	Sede: Salreu, Estarreja	Parceiro cultural
Câmara Municipal de Estarreja	www.cm-estarreja.pt	Parceiro municipal
IEFP — Centro de Emprego de Aveiro	www.iefp.pt	Parceiro institucional
Universidade de Aveiro	www.ua.pt	Parceiro académico

